

**Управление знаниями в ИСЦАУЗР - фаза II**  
**Ежегодное совещание проекта по планированию**  
28-30 апреля, 2014 г., Миран Интернэшнл, Ташкент, Узбекистан  
**Протокол совещания**

Проект по управлению знаниями в ИСЦАУЗР - Фаза II, реализуется Международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) при поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД) с февраля 2013 года. Проект направлен на создание платформы знаний для консолидации знаний, полученных в ИСЦАУЗР -Фазе I и распространения подходов и технологий по устойчивому управлению земельными ресурсами (УУЗР) в пяти странах-участницах проекта (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Цели данного совещания: (1) обзор достижений и трудностях 1-го года реализации проекта и (2)совместное планирование с партнерами мероприятий 2-го года. Программа совещания приводится в Приложении А.

Более 60 участников приняли участие в совещании, включая команды, которые представляли страны-партнеры, в состав которых вошли партнеры из министерств, научно-исследовательских институтов, сельских консультационных служб (включая НПО), гражданского общества, фермеров и фермерских объединений, организаций, которые были задействованы в реализации проектов в ИСЦАУЗР - Фазе I, а также региональные и международные организации, осуществляющие свою деятельность в Центральной Азии. Их участие в заседании являлось весьма важным для продуктивности дискуссий и в детализации деятельности по планированию проекта и механизмов реализации. Список участников приводится в Приложении В.

Мероприятие было открыто д-ром Рустамом Ибрагимовым, Начальник отдела по международным связям Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. Работа совещания была начата с приветствия со стороны ИКАРДА (Тейб Овейс и Джозеф Турок) с последующими презентациями, раскрывающими цели и ожидаемые результаты данного совещания (Ферас Зиадат), а также докладами об общих достижениях, прогрессе и пробелах, которые необходимо восполнить (Акмаль Акрамханов).

Встреча была разделена на несколько пленарных заседаний: обзор достижений проекта и страновых групп проекта за первый год деятельности и разработка плана работ на второй год для каждого компонента проекта (по группам).

#### **Сессия 1: Презентации стран: Достижения и проблемы**

##### **Председатель и докладчики: Акмаль Акрамханов, Рамазан Кузиев, Ферас Зиадат**

В рамках данной сессии были представлены презентаций четырех стран Центральной Азии о прогрессе, достигнутом на сегодняшний день в соответствии с планом работы на первый год. Каждая страна (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) и каждый компонент представили свою деятельность и достигнутые результаты в своих презентациях. После презентации каждой страны предоставлялось время для обсуждения доклада, чтобы позволить участникам задать вопросы и озвучить комментарии.

Среди заданных вопросов были вопросы относительно оптимальной плотности поголовья и концептуального определения названия подходов и технологий, например, по ресурсосберегающему земледелию. Общий консенсус в том, что не существует одной общепринятой величины численности поголовья скота на гектар земли, так как это определяется

продуктивностью пастбищ а, следовательно, значения меняются. Однако, все же некоторые нормы, сохранившиеся с советских времен, могут использоваться в качестве индикаторов и основополагающих данных.

Существует целый ряд различных определений практики ресурсосберегающего земледелия, начиная с определения ФАО трех руководящих принципов, заканчивая минималистскими определениями, которые включают в себя только нулевую вспашку и севооборот. Нынешнее определение, используемое в этом проекте для определения ресурсосберегающего земледелия, было перенято из WOCAT. Было решено, что проект проявит некоторую гибкость в определении «ресурсосберегающего земледелия» в соответствии с принципами и мандатом проекта. Но необходимо четко сформулировать определение, чтобы избежать путаницы в материалах, которые распространяются для общественного использования на региональном и международном уровнях.

Для технологии гребневого посева существует успешный опыт разработки оборудования в рамках проекта ИКАРДА в Египте. Низкозатратное оборудование, адаптированное и воспроизведенное в Египте было испытано в Сирии. Существует потенциальная возможность опробовать оборудование для гребневого посева и в Центральной Азии. Партнеры поддержали эту идею, так как потребность в таком оборудовании в Центральной Азии высока. Испытание оборудования совместно с фермерами поможет широкому распространению и внедрению технологий.

Было предложено классифицировать выбранные технологии УУЗР по следующим критериям : (I) готовые к распространению, (II) уровень готовности, (III) сложности из-за нормативных вопросов / неблагоприятных экологических и других барьеров. Такую информацию можно получить из результатов отбора технологий с использованием критериев, которые включают такие категории.

Было также отмечено относительно собранных технологий УУЗР, чтобы не только собрать то, что, так или иначе, является более доступным («низко висящие плоды»), а углубляться в поиски различных вариантов. Важно отметить, что коллекция технологий УУЗР не является полной и страновые группы продолжают работу по определению традиционных технологий или подходов, которые имеются у фермеров или мелких производителей.

Распространение готовых технологий УЗР является срочной необходимостью, потому что внедрение происходит постепенно, и в настоящее время нет конкретной системы или подхода относительно реализации или содействия инновациям. Поэтому крайне важно обратить внимание на создание таких подходов и, возможно, использовать существующие структуры и организации для распространения УУЗР. Опыт создания организаций в предыдущих проектах, таких как центры обучения, консультаций и инноваций в Кыргызстане, может быть полезным в данных вопросах. Кроме того, существуют также учреждения/системы в странах-партнерах, которые играют решающую роль в распространении технологий.

Итоги первого дня: на основе представленных достижений, следующие пункты были согласованы для деятельности каждого компонента во второй год, и в дополнение к /или для поддержки запланированных мероприятий:

Компонент 1 - уточнение мероприятий по включению сбора традиционных знаний;

Компонент 2 – фокус проекта во второй год: Создание базы знаний; помощь страновым группам в компоновке и распространении знаний; команде проекта необходимо разработать структуру для осуществления данных работ;

Компонент 3 - необходимость начать диалог с руководящими кругами; существенным является определить каким должен быть формат диалога; необходимы стратегические документы, технико-экономический анализ технологий (стратегически приемлемый, социально - жизнеспособный и т.д.)

## **Сессия 2: Разработка детального плана на второй год**

### **Председатель и докладчик: Абдулла Сапаров, Мария Глазырина**

Это заседание было посвящено подготовке детального рабочего плана на второй год. Для этого, участникам были представлены достижения первого года в соответствии с планом работ, также был распространен 3-х летний план работ для групповых дискуссий. Участники разделились на 3 группы по компонентам: (1) синтез и разработка знаний; (2) компоновка и распространение знаний; и (3) использование знаний в стратегическом диалоге. Был использован тот же шаблон, который использовался для планирования первого года. Примечания, полученные в ходе группового обсуждения, приведены в Приложении С.

Планы работ для второго года по каждому компоненту приведены в Приложении D. Три плана работ было представлено на пленарном заседании для обсуждения и окончательной разработки с учетом мнений соответствующих специалистов по внедрению трех компонентов.

Среди дискуссионных вопросов был поднят вопрос гендерного характера. Гендерные вопросы необходимо интерпретировать контекстуально, и не ограничивается только вопросов касающихся женщин. Необходимо включить в данный аспект проблемы молодежи, питание, динамику домашних хозяйств, мужчин и т.д. Относительно УУЗР можно включить исследование барьеров, с которыми сталкиваются мужчины, женщины и молодежь относительно доступа к знаниям по технологиям УУЗР, вопросам, связанным с адаптацией технологий, а также распределительными выгодами (или компромиссами) от принятия технологий УУЗР мужчинами, женщинами, молодежью и другими членами семьи.

Что касается изменения климата, то пробел в знаниях был отмечен не только в этом регионе, но и во всем мире. Существует необходимость содействия институционализации механизмов адаптации технологий. Необходимо, чтобы страны взяли на себя ответственность за распространение и детализацию климатических данных, для того, чтобы оценить ситуацию и быть более осведомленными относительно воздействия изменения климата на сельское хозяйство, найти пути адаптации к изменению климата и пригодные для этого технологии и пакеты УУЗР. Стабильные методологические подходы по адаптации к изменению климата в каждой стране будут служить примером для дальнейшего продвижения и распространения технологий. Команда проекта подчеркнула важность номинации подходящих кандидатов из учреждений НССХИ каждой страны-участницы для участия в тренингах по CropSyst, созданию карт подобия GIS и распространению результатов Глобальных Моделей циркуляции на местном уровне.

Важно также включить план работ для Компонента 2, процесс распространения, который включает те учреждения, которые в настоящее время существуют (например, Ассоциации водопользователей, ассоциации фермеров, центры для инноваций и образования, сельские консультативные услуги и т.д.).

Команды компонентов имели дополнительное время (полдня в третий день) для окончательного обсуждения и предоставления замечаний, полученные в ходе пленарных докладов.

### **Сессия 3: Расширение связей и укрепление партнерства**

#### **Председатель и докладчик: Давлатжон Комилзода, Тулкин Юлдашев**

Для создания и укрепления сотрудничества с партнерскими организациями, занимающимися УУЗР в регионе, на данное заседание были приглашены разные организации. Доклады были представлены Научно-информационным центром Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК), работающим на региональном уровне в Центральной Азии. В презентациях был представлен организационный опыт в области наращивания потенциала и развития человеческих ресурсов для внедрения инноваций в аграрном секторе засушливых земель в Центральной Азии.

Во всех докладах было отмечено, что во всех постсоветских странах наблюдается недостаточное количество консультативных служб для распространения новых передовых технологий. Представители НИЦ МКВК подчеркнули важность создания механизмов трансформации знаний по уже готовым и проверенным технологиям на язык, понятный фермерам, посредством создания и распространения брошюр, буклетов и организации фермерских дней. Д-р Овейс рекомендовал также обратить внимание на вопросы, связанные орошением и коллекторно-дренажной системой в Кыргызстане. GIZ представили свой опыт и отметили готовность к сотрудничеству в рамках проекта по управлению пастбищами в Узбекистане и недавно- разработанного центра знаний «KNUB2.0.». Представитель CAREC представил свою организацию и деятельность, которую они осуществляют в регионе.

ПРООН в Узбекистане представил недавно завершённый проект ИСЦАУЗР, который был использован для формирования нового проекта под эгидой ИСЦАУЗР при поддержке ГЭФ. Этот новый 5-летний проект направлен на снижение давления, в частности, в неорошаемых регионах Узбекистана и охватывает широкую область пастбищных и горных экосистем проекта УЗ-ИСЦАУЗР II.

### **Сессия 4: Бюджет проекта, выводы и завершение**

#### **Председатель и докладчик: Нурлан Дуйшеев, Шинан Кассам, Акмал Акрамханов**

В ходе данной сессии страновые группы доработали свои планы в соответствии с планами работ для каждого компонента.

Бюджет проекта был обсужден. Было представлено его распределение между различными компонентами и бюджетными статьями. Бюджет проекта на второй год основан на практике первого года с некоторыми изменениями относительно суммы для национальных партнеров и компонентов, соответственно. В целом, бюджетная статья проекта для национальных партнеров была значительно увеличена, чтобы поощрить усилия, необходимые для оценки и распространения собранных технологий УУЗР.

Кроме проектных средств, команде проекта удалось привлечь дополнительные ресурсы из других программ в регионе. А именно, дополнительные 50 000 долларов США были выделены для проекта из средств исследовательской программы Консорциума КГМСХИ «Засушливые системы»; и еще 100 тысяч долларов США из фонда РФ для Центров КГМСХИ. Эти средства направлены на укрепление партнерских отношений и синергию усилий, осуществляемых в рамках программ и проектов.

## Распределение бюджета на второй год проекта, доллары США

Бюджетные статьи	Компонент I		Компонент II		Компонент III		ИПК-ЗС	Финансирование РФ
	НССХИ	Региональная деятельность / ИКАРДА	НССХИ	Региональная деятельность / ИКАРДА	НССХИ	Региональная деятельность / ИКАРДА		
Штат сотрудников	20,000	40,000	10,000	37,000	9,000	37,000	50,000	100,000
Операционные расходы	30,000	10,000	20,000	7,000	15,000	5,500		
Командировки	7,000	10,000	3,500	6,000	12,000	12,000		
Тренинги	77,000	17,000	20,000	5,000	15,000	5,000		
Оборудование	20,000	9,000	9,000	5,000	5,000	2,500		
<b>ВСЕГО</b>	<b>154,000</b>	<b>86,000</b>	<b>62,500</b>	<b>60,000</b>	<b>56,000</b>	<b>62,000</b>		

Стоит отметить, что распределение средств было осуществлено на основе имеющихся ресурсов. С другой стороны, предоставление этих ресурсов будет зависеть от согласованных деталей и прогресса, достигнутого в каждом компоненте и деятельности страновых групп. Предоставление ресурсов будет зависеть от предложений, полученных от страновых групп относительно осуществления проектной деятельности. Страновые группы должны подготовить предложения для получения средств, выделяемых для каждого компонента, и соответственно, должны будут продемонстрировать прогресс мероприятий в рамках проекта.

Демонстрационные участки должны поддерживаться данным проектом в рамках более крупных ИПК, которые имеют отношение к данным спутниковым (сопутствующим) участкам. В то же время, если демонстрационный участок расположен за пределами действия или за пределами спутниковых участков, но сам демонстрационный участок создан для распространения созданных практик УУЗР, то можно включить его в деятельность более крупных ИПК.

Еще один важный аспект относительно распределения средств между ИКАРДА и НССХИ. Следует отметить, что, часть предоставляемых средств предназначаются не только для ИКАРДА, а для осуществления региональных мероприятий в рамках данного проекта, под предводительством ИКАРДА.

### Выводы и завершение

- Благодарность всем участникам за их ценный вклад и сотрудничество в этом проекте
- Участие руководящих кругов в ежегодном совещании весьма поддерживает проект. Благодарность д-ру Дюшееву за вклад в проект.
- Активное участие НССХИ и международных организаций, таких как GIZ приветствуется. Мы надеемся, что Туркменистан сможет принять участие в следующей встрече.
- Комплексная работа ИКАРДА в рамках различных программ (IWLMР, SEPR, CODIS) приносит междисциплинарный вклад для решения проблем

## Приложение А. Программа совещания



Управление знаниями в рамках второй фазы ИСЦАУЗР

Ежегодное совещание проекта

28-30 апреля 2014 г.

Миран Интернешнл, Ташкент, Узбекистан

### День-1, понедельник, 28 апреля 2014 г.

09:00–09:30	Регистрация	
09:30–09:40	Приветственная речь, представление участников	Дж. Турок, Т. Овейс
	Приветственная речь принимающей страны	
	Цели совещания и ожидаемые результаты	Ф. Зиадат
09:40–10:00	Общие цели и достижения, пробелы	А. Акрамханов
СЕССИЯ 1	Презентации стран о достижениях и трудностях	
	Председатель:	
10:00–11:00	Казахстан: Компонент 1 – Синтез знаний	Г.Токсейитова
	Компонент 2 – Компоновка и распространение знаний	Д. Сыдык
	Компонент 3 – Использование знаний в диалоге по вопросам разработки стратегий	А. Отаров
11:00–11:30	Групповое фото; кофе брейк	
11:00–12:00	Кыргызстан: Компонент 1 – Синтез знаний	Г. Елеманова
	Компонент 2 – Компоновка и распространение знаний	А. Атаканов
	Компонент 3 – Использование знаний в диалоге по вопросам разработки стратегий	М. Батыржанов
12:00–13:00	Таджикистан: Компонент 1 – Синтез знаний	Т. Нарзуллоев
	Компонент 2 – Компоновка и распространение знаний	Д. Комилзода
	Компонент 3 – Использование знаний в диалоге по вопросам разработки стратегий	К. Курбанов
13:00–14:00	Обед	
14:00–15:00	Туркменистан: Компонент 1 – Синтез знаний	А. Сапармырадов
	Компонент 2 – Компоновка и распространение знаний	Д. Кадыров
	Компонент 3 – Использование знаний в диалоге по вопросам разработки стратегий	Ч. Таганов
15:00–16:00	Узбекистан: Компонент 1 – Синтез знаний	М. Ташкузиев
	Компонент 2 – Компоновка и распространение знаний	Н.Абдурахманов
	Компонент 3 – Использование знаний в диалоге по вопросам разработки стратегий	З.Баходиров
16:00–16:30	Кофе брейк	
16:30–17:30	Обсуждение отчетов по достижениям и трудностям (по странам, компонентам и экосистемам)	А. Акрамханов

### День-2, Вторник, 29 апреля 2014 г.

СЕССИЯ 2	Разработка рабочего плана для второго года	
09:00–09:30	Пленарная сессия для обсуждения рабочего плана на второй год (рассмотрение трехлетнего плана и анализ достигнутого прогресса)	А. Акрамханов
09:30–10:30	Параллельные рабочие группы (по компонентам) подведут итоги по оперативному плану реализации	Ф. Зиадат Ш. Кассам
10:30–11:00	Кофе брейк	
11:00–13:00	Параллельные рабочие группы (по компонентам/странам) подведут итоги по оперативному плану реализации	
13:00–14:00	Обед	
14:00–15:30	Параллельные рабочие группы (по компонентам/странам) подведут итоги по оперативному плану реализации	
15:30–16:00	Кофе брейк	
СЕССИЯ 3	Расширение связей и укрепление партнерства	
	Председатель	
16:00–17:30	НИЦ МКВК Укрепление потенциала и развитие персонала для внедрения инноваций в с/х засушливых регионах ЦА	В. Духовный
	Проект GIZ по управлению пастбищами и проект по управлению знаниями KHub2.0	А. Расулов
	Обзор региональной деятельности РЭЦЦА	Т. Султанов
	Обзор проектов ПРООН в Узбекистане и ИСЦАУЗР, планы на будущее	У. Назаркулов
19:00	Торжественный ужин	

### День-3, Среда, 30 апреля 2014 г.

09:00–09:30	Представление рабочего плана для второго года	
09:30–10:30	Параллельные рабочие группы (по странам) подведут итоги по оперативному плану реализации	Команды стран
10:30–11:00	Кофе брейк	
11:00–12:00	Пленарное заседание, презентации рабочих групп по формированию планов на ближайшую перспективу	Команды стран
	Выводы и завершение совещания	
15:00–16:00	Следующие шаги - Оценка совещания - Заключительная речь	
13:00–14:00	Обед	
14:00–18:00	Подготовка к Совещанию Руководящего Комитета	Команда проекта

## Приложение В. Список участников



Проект по «Управлению знаниями» в рамках второй фазы ИСЦАУЗР  
Ежегодный семинар по планированию  
28-30 апреля 2014 г., Ташкент, Узбекистан

### СПИСОК УЧАСТНИКОВ

#	И.Ф.	Организация	Страна	Должность	Контактные данные
<b>Партнеры - Национальная система сельскохозяйственных исследований (НССХИ)</b>					
1.	Д-р Азимбай Отаров	КазНИИПА	Казахстан	Глава отдела	Тел.: 8-727-245-54-74; <a href="mailto:azimbay@bk.ru">azimbay@bk.ru</a>
2.	Д-р Абдулла Сапаров	Казахский НИИ почвоведения и агрохимии имени Успанова (КазНИИПА)	Казахстан	Генеральный директор	Тел.: +727 269-47-49; <a href="mailto:ab.saparov@mail.ru">ab.saparov@mail.ru</a>
3.	Д-р Доссимбек Сидик	Юго-Западный НИИ животноводства и растениеводства	Казахстан	Глава отдела	Тел.: +7 252 55-40-13, <a href="mailto:nii-tassai@rambler.ru">nii-tassai@rambler.ru</a>
4.	Д-р Гульнар Токсейитова	КазНИИПА	Казахстан	Глава отдела	Тел.: +727 269-47-45; <a href="mailto:tokseitova-2011@mail.ru">tokseitova-2011@mail.ru</a>
5.	Г-н Карим Худайбердиев	Ферма (крестьянское хоз-во) "НурАгро"	Казахстан	Глава фермы	<a href="mailto:ab.saparov@mail.ru">ab.saparov@mail.ru</a>
6.	Д-р Аманжол Атаканов	Кыргызский НИИ ирригации	Кыргызская Республика	Заместитель директора	Тел.: +996 312 541171; <a href="mailto:aatakanov@mail.ru">aatakanov@mail.ru</a>
7.	Д-р Мырзабек Батырканов	Кыргызский национальный аграрный университет	Кыргызская Республика	Декан факультета	Тел.: +996 312 59-54-21; <a href="mailto:batyrkanov_myrzabek@mail.ru">batyrkanov_myrzabek@mail.ru</a>
8.	Д-р Нурлан Дуйшеев	Министерство сельского хозяйства и мелиорации	Кыргызская Республика	Госсекретарь	Тел.: +996 312 62-53-66; <a href="mailto:duysheev57@mail.ru">duysheev57@mail.ru</a>
9.	Д-р Гульмира Элеманова	Министерство сельского хозяйства и мелиорации	Кыргызская Республика	Старший сотрудник	Тел.: +996 312 620682; <a href="mailto:elemanova@rambler.ru">elemanova@rambler.ru</a>
10.	Д-р Парвин Джабборов	НИИ сельского хозяйства	Таджикистан	Ученый секретарь	<a href="mailto:ziroatkor@mail.ru">ziroatkor@mail.ru</a>
11.	Д-р Обиддин Джамшедов	Опытная станция НИИ садоводства (Жиргатал)	Таджикистан	Директор	Тел.: +992 37 2217004; <a href="mailto:taskhn@mail.ru">taskhn@mail.ru</a>
12.	Проф. Давлатжон Комилзода	Таджикская академия сельскохозяйственных наук	Таджикистан	Главный ученый секретарь	<a href="mailto:komizoda-50@mail.ru">komizoda-50@mail.ru</a>
13.	Г-н Камолитдин Курбонов	Таджикская академия сельскохозяйственных наук	Таджикистан	Ведущий специалист	Тел.: +992 37 882-94-32; <a href="mailto:kamoliddin-kurbonov@rambler.ru">kamoliddin-kurbonov@rambler.ru</a>
14.	Г-н Шамсиддин Махмудов	НПО Агролизинг	Таджикистан	Глава	<a href="mailto:agrolizing@rambler.ru">agrolizing@rambler.ru</a>
15.	Д-р Тош Нарзуллоев	НИИ сельского хозяйства	Таджикистан	Заместитель директора	Тел.: +992 917 964362; <a href="mailto:ziroatkor@mail.ru">ziroatkor@mail.ru</a>
16.	Д-р Гульнисо Некушоева	НИИ почвоведения	Таджикистан	Специалист	Тел.: +992 919 009246 <a href="mailto:gulniso@mail.ru">gulniso@mail.ru</a>

17.	Д-р Мамаджон Сафаров	НИИ Земледелия	Таджикистан	Начальник отдела механизации и новых технологий	Тел.: +992 37 2217004; <a href="mailto:taskhn@mail.ru">taskhn@mail.ru</a>
18.	Д-р Камолходжа Султанов	Опытная станция НИИ садоводства (Самгар)	Таджикистан	Председатель	Тел.: +992 37 2217004; <a href="mailto:taskhn@mail.ru">taskhn@mail.ru</a>
19.	Д-р Нодир Абдурахманов	Государственный НИИ почвоведения и агрохимии	Узбекистан	Глава отдела	Тел.: +998 71 2467600; <a href="mailto:gosniipa@gmail.com">gosniipa@gmail.com</a>
20.	Г-н Зафар Баходиров	Государственный НИИ почвоведения и агрохимии	Узбекистан	Старший научный сотрудник, докторант	Тел.: +998 93 6846114; <a href="mailto:zafarbahodirov@gmail.com">zafarbahodirov@gmail.com</a>
21.	Г-н Толиб Бердиев	Государственный НИИ почвоведения и агрохимии	Узбекистан	Специалист	Тел.: +998 71 2271399; <a href="mailto:gosiipa@gmail.com">gosiipa@gmail.com</a>
22.	Д-р Рустам Ибрагимов	Министерство сельского и Водного Хозяйства	Узбекистан	Начальник отдела	Тел.: +998 71 2410181; <a href="mailto:info@aero.uz">info@aero.uz</a>
23.	Д-р Рамазан Кузиев	Государственный НИИ почвоведения и агрохимии	Узбекистан	Заместитель директора	Тел.: +998 71 2460950; <a href="mailto:gosiipa@gmail.com">gosiipa@gmail.com</a>
24.	Д-р Абдумалик Намозов	Министерство сельского и Водного Хозяйства	Узбекистан	Начальник управления	Тел.: +998 71 2442330; <a href="mailto:abdumalik.namozov@rambler.ru">abdumalik.namozov@rambler.ru</a>
25.	Д-р Шерали Нурматов	УзНПЦСХ	Узбекистан	Генеральный директор	Тел.: +998 71 2449152; <a href="mailto:iim@qsv.uz">iim@qsv.uz</a>
26.	Д-р Инна Руденко	Ургенский государственный университет	Узбекистан	Ассистент профессора	Тел.: +998 93 7547790; <a href="mailto:irudenko@mail.ru">irudenko@mail.ru</a>
27.	Д-р Камолитдин Садыков	Государственный Комитет по Охране Природы	Узбекистан	Заместитель председателя	Тел.: +99871 239-14-99; <a href="mailto:info@uznature.uz">info@uznature.uz</a>
28.	Г-жа Муниса Саидова	Ташкентский государственный аграрный университет	Узбекистан	Специалист	Тел.: +998 93 5673559; <a href="mailto:munisa.saidova@mail.ru">munisa.saidova@mail.ru</a>
29.	Д-р Маруф Ташкузиев	Государственный НИИ почвоведения и агрохимии	Узбекистан	Глава отдела	Тел.: +998 71 2271399; <a href="mailto:maruf41@rambler.ru">maruf41@rambler.ru</a>
30.	Д-р Гульнехра Хасанханова	УзГИП	Узбекистан	Заведующая отдела	Тел.: +998 71 9746468; <a href="mailto:g.khasanhanova@mail.ru">g.khasanhanova@mail.ru</a>
31.	Г-н Мирзохид Юлдашев	Центр агро-информации - инновация Узбекистана при Совете Фермеров	Узбекистан	Директор центра	Тел.: +998 71 2674194; <a href="mailto:y_mirzohid@mail.ru">y_mirzohid@mail.ru</a>
<b>Сотрудники Международных центров по сельскохозяйственным исследованиям</b>					
32.	Д-р Акмал Акрамханов	ИКАРДА-ЦАК	Узбекистан	Координатор проекта, Уз в рамках II фазы ИСЦАУЗР	Тел.: +998-71-2372169; <a href="mailto:a.akramkhanov@ggiar.org">a.akramkhanov@ggiar.org</a>


33.	Д-р Ботыр Досов	ИКАРДА-ЦАК	Узбекистан	Консультант, Инновационная платформа	Тел.: +998 71 2372169; <a href="mailto:b.dosov@cgiar.org">b.dosov@cgiar.org</a>
34.	Д-р Мария Глазырина	ИКАРДА-ЦАК	Узбекистан	Специалист по моделированию культур и изменению климата	Тел.: +998 71 2372169; <a href="mailto:m.glazirina@cgiar.org">m.glazirina@cgiar.org</a>
35.	Г-н Кахрамон Жумабоев	ИВМИ, Центральноазиатский офис	Узбекистан	Научный работник	Тел.: +998 71 2370445; <a href="mailto:k.jumaboev@cgiar.org">k.jumaboev@cgiar.org</a>
36.	Д-р Ферас Зиадат	ИКАРДА, Программа по интегрированному управлению водными и земельными ресурсами	Иордания	Специалист по ресурсосберегающему почвоведению	Тел.: +962 06 533 1237; <a href="mailto:f.ziadat@cgiar.org">f.ziadat@cgiar.org</a>
37.	Д-р Акмал Каримов	ИВМИ, Центральноазиатский офис	Узбекистан	И.О. директора	Тел.: +998 71 2370445; <a href="mailto:a.karimov@cgiar.org">a.karimov@cgiar.org</a>
38.	Д-р Шинан Кассам	ИКАРДА, Программа по социально-экономическим и политическим исследованиям	Иордания	Ученый	Тел.: +962 06 533 1237; <a href="mailto:s.kassam@cgiar.org">s.kassam@cgiar.org</a>
39.	Г-н Нариман Нишанов	ИКАРДА-ЦАК	Узбекистан	Координатор полевых исследований проекта	Тел.: +998 71 2372169; <a href="mailto:n.nishanov@cgiar.org">n.nishanov@cgiar.org</a>
40.	Д-р Азиз Нурбеков	ИКАРДА-ЦАК	Узбекистан	Координатор полевых исследований проекта	Тел.: +998 71 2372169; <a href="mailto:a.nurbekov@cgiar.org">a.nurbekov@cgiar.org</a>
41.	Д-р Тейб Овейс	ИКАРДА, Программа по интегрированному управлению водными и земельными ресурсами	Иордания	Заместитель директора	<a href="mailto:t.owais@cgiar.org">t.owais@cgiar.org</a>
42.	Д-р Дебра Турнер	ИКАРДА, Программа по интегрированному управлению водными и земельными ресурсами	Иордания	Старший специалист по плодородию почвы	<a href="mailto:d.turner@cgiar.org">d.turner@cgiar.org</a>
43.	Г-н Тулкин Юлдашев	ИКАРДА-ЦАК	Узбекистан	Специалист по почвенным и водным ресурсам	Тел.: +998 71 2372169; <a href="mailto:t.yuldashev@cgiar.org">t.yuldashev@cgiar.org</a>
<b>Отдел по Реализации Программы</b>					
44.	Г-н Мугалиб Бегмуратов	КГМСХИ-ОРП	Узбекистан	Специалист по связям	Тел.: +998 71 2372169; <a href="mailto:m.beemuratov@cgiar.org">m.beemuratov@cgiar.org</a>
45.	Г-же Альбина Бекметова	КГМСХИ-ОРП	Узбекистан	Административный сотрудник	Тел.: +998 71 2372169; <a href="mailto:a.bekmetova@cgiar.org">a.bekmetova@cgiar.org</a>
46.	Г-н Шерзод Косимов	КГМСХИ-ОРП	Узбекистан	Специалист по ИТ	Тел.: +998 71 2372169; <a href="mailto:Q.sherzod@cgiar.org">Q.sherzod@cgiar.org</a>

47.	Д-р Джозеф Турок	КГМСХИ-ОРП /ИКАРДА-ЦАК	Узбекистан	Глава/Региональный координатор	Тел.: +998 71 2372130; <a href="mailto:j.turok@cgiar.org">j.turok@cgiar.org</a>
<b>Агентства по исследованию и развитию</b>					
48.	Г-н Аббос Ахадов	ФАО Узбекистан	Узбекистан	Руководитель программы	Тел.: +998 98 7777473; <a href="mailto:abbos.akhadov@fao.org">abbos.akhadov@fao.org</a>
49.	Г-н Алексей Волков	ПМГ/ГЭФ Узбекистан	Узбекистан	Национальный координатор	Тел.: +998 71 1203462; <a href="mailto:alexey.volkov@undp.org">alexey.volkov@undp.org</a>
50.	Проф. Виктор Духовный	НИЦ-МКВК	Узбекистан	Директор	Тел.: +998 71 2659295; <a href="mailto:dukh@icwc-aral.uz">dukh@icwc-aral.uz</a>
51.	Д-р Динара Зиганшина	НИЦ-МКВК	Узбекистан	Заместитель директора	Тел.: +998 71 2659295; <a href="mailto:dinara.ziganshina@gmail.com">dinara.ziganshina@gmail.com</a>
52.	Д-р Улугбек Исламов	ПРООН Узбекистан	Узбекистан	И.О. главы отдела	Тел.: +998 71 1203450; <a href="mailto:ulugbek.islamov@undp.org">ulugbek.islamov@undp.org</a>
53.	Д-р Шайбек Карасартов	Центр по обучению, консультациям и инновациям	Кыргызская Республика	Директор	Тел.: +996 312 365569; <a href="mailto:director@taic.kg">director@taic.kg</a>
54.	Д-р Шухрат Мухамеджанов	НИЦ-МКВК	Узбекистан	Руководитель программы	Тел.: +998 71 2650957; <a href="mailto:shukhrat_m@icwc-aral.uz">shukhrat_m@icwc-aral.uz</a>
55.	Д-р Умид Назаркулов	ПРООН ИСЦАУЗР	Узбекистан	Технический координатор	Тел.: +998 90 9606931; <a href="mailto:umid.nazarkulov@email.com">umid.nazarkulov@email.com</a>
56.	Г-н Азиз Расулов	ГИЦ Узбекистан	Узбекистан	Национальный координатор проекта, Управление пастбищами	Тел.: +998 71 1200301; <a href="mailto:azizjon.rasulov@giz.de">azizjon.rasulov@giz.de</a>
57.	Д-р Джуманазар Рузимов	КРАСС	Узбекистан	Финансовый менеджер	Тел.: +998 91 4349379; <a href="mailto:ruzimov_j@mail.ru">ruzimov_j@mail.ru</a>
58.	Г-н Толиб Султанов	РЭЦЦА	Узбекистан	Директор представительства	Тел.: +998 71 2773787; <a href="mailto:tsultanov@carec.kz">tsultanov@carec.kz</a>
59.	Д-р Тулкин Фармонов	ПРООН ИСЦАУЗР	Узбекистан	Руководитель проекта	Тел.: 998 93 5360767; <a href="mailto:tulkin.farmonov@undp.org">tulkin.farmonov@undp.org</a>
60.	Д-р Кристиан Хергартен	Университет Центральной Азии	Кыргызская Республика	Старший научный сотрудник	Тел.: +996 312 910822; <a href="mailto:christian.hergarten@jcentralasia.org">christian.hergarten@jcentralasia.org</a>
61.	Д-р Абдуразақ Хужабеков	МФСР Узбекистан	Узбекистан	Специалист национальной программы	Тел.: +998 93 5841788; <a href="mailto:razak@list.ru">razak@list.ru</a>
62.	Г-жа Наталия Шулепина	<a href="http://sreda.uz">sreda.uz</a>	Узбекистан	Веб редактор	Тел.: +998 90 9125835; <a href="mailto:shulepina@bk.ru">shulepina@bk.ru</a>



Приложение С  
Результаты групповых дискуссий

Исследования	Методология	Рез. По
2.1. Анализ условий (тип почвы, влажность, типичные культуры)	<p>Методология исследования включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Определение условий, структуры и ее функции в Азии и возможности ее интерпретации SLM</li> <li>С использованием SLM с учетом опыта и знаний экспертов и практических работников (FAO, ICRISAT, CIMMYT, ICRAF и др.)</li> <li>Анализ SLM по условиям</li> </ul>	
2.2. Анализ данных (сравнение и оценка)	<p>Разработка методик и программ по обработке и анализу данных SLM по разным типам культур</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка программы для компьютерного лабораторного</li> </ul>	
2.3. Интерпретация результатов	<p>Интерпретация результатов по результатам исследования (по методике) и по результатам SLM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка программы для компьютерного лабораторного</li> </ul>	

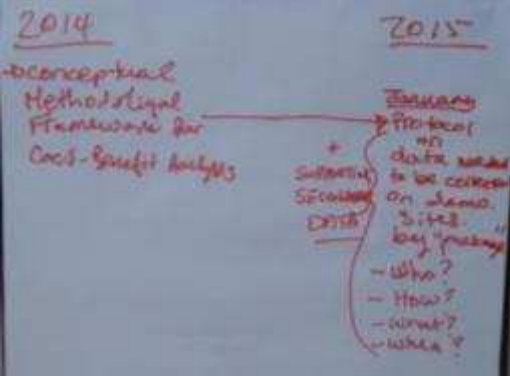

UZ	April 2014	23	230
irri	1. raised bed + mulch	3h	200\$/ha
	2. Syndryal (saline)	(for 3 years)	
rainfed	Az. z. m. m. m.		
pasture	replanting system	2.5 ha	
	numbering using ES		
	grazing system		
irri	ES	1 ha	2000\$/ha
rainfed	min. 10	2.5 ha	
pasture	replant (m-m)	2 ha	
rainfed	?		

KZ	add data
irrigated	10 ha, 2000\$/ha
rainfed	10 ha, 2000\$/ha
pasture	10 ha, 2000\$/ha
TJ	
irri	1 ha, 2000\$/ha
rainfed	1 ha, 2000\$/ha
pasture	1 ha, 2000\$/ha

Приложение D

Рабочий план для второго года по компонентам

Детальный рабочий план на второй год (апрель 2014 г. - апрель 2015 г.) - Компонент I

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
Деятельность 1.1: синтез знаний (идентификация знаний и существующих пробелов в знаниях)	Синтезирование и консолидация лучших практик УУЗР, используемых местными сельскохозяйственными производителями ( <b>местные знания</b> ), в легкодоступные продукты	Использование стандартного шаблона чтобы представить информацию о выбранных практиках УУЗР	Будет обсужден о позже	Выбранные методы УУЗР ( <b>местные знания</b> ) представлены в стандартном формате	1 сентября 2014 г.	
	Биофизическая оценка (на основе модели) воздействия изменчивости и изменения климата	Разработка метода оценки воздействия изменения климата	Будет обсужден о позже	Отчет, включая описание разработанных методов оценки воздействия изменения климата Оценка посредством отбора выбранных практик УУЗР	31 декабря 2014 г.	
<b>Деятельность 1.2: генерация знаний о практиках УУЗР (восполнение пробелов в знаниях)</b>	Наращивание потенциала в области распространения информации, связанной с изменением климата в глобальном масштабе в ЦАК ( на субрегиональном и национальном уровнях)	Тренинг по распространению результатов GCM	Будет обсужден о позже	Калибровка модели распространения знаний и обучение национальных сотрудников	1 июля 2014 г.	
	Провести распространение информации, связанной с изменением климата в глобальном масштабе, в ЦАК (на субрегиональном и национальном уровнях)	Применение моделей внедрения для стран ЦА		Выбранные практики GCM распространены в странах ЦА	31 декабря 2014 г.	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
	Оценка полевого участка для подтверждения предлагаемых практик УУЗР и адаптации к изменению климата, демонстрация перспективных технологий	Определить практики УУЗР, которые в настоящее время уже продемонстрированы и при необходимости организовать полевые участки, чтобы продемонстрировать другие перспективные практики УУЗР	Будет обсуждено позже	Демонстрационные поля готовы и доступны для фермеров и участников проекта	Начало в марте 2014 г. Полугодовые отчеты до конца проекта	
	Определить, продемонстрировать и создать лучшие практики УУЗР с учетом гендерных аспектов для интегрированных систем управления земельными ресурсами	Определить практики УУЗР, связанные с гендерными аспектами, и продемонстрировать сельским сообществам, информирование и наращивание потенциала среди стран  Сборник социально-экономических показателей (связанно в <a href="#">Компонентом III</a> )	Будет обсуждено позже	Демонстрация практик УУЗР, связанных с гендерными аспектами	Базовое исследование к XII-2014 г. Постоянный мониторинг	
<b>Деятельность 1.3: компановка и распространение знаний</b>	Характеристика биофизических и социально-экономических требований текущих и предлагаемых практик УУЗР	Критерии подобию для каждой перспективной практики УУЗР определены национальными и региональными экспертами	Будет обсуждено позже	Таблица для каждой перспективной практики УУЗР и отчет для обоснования критериев подобию	1 сентября 2014 г.	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
	Выявление потенциальных областей и сообществ, где практики УУЗР являются устойчивыми и лучше всего подходят	<p>Использование критерий подобию и доступных карт/данных для создания карт подобию на региональном и национальном уровнях,</p> <p>Проведение регионального учебного семинара</p> <p>Поддержка связи с организацией-разработчиком практики для дальнейшего использования самой практики</p>	Будет обсужден о позже	Карты и отчеты	31 декабря 2014 г.	

Детальный рабочий план на второй год (апрель 2014 г. - апрель 2015 г.) - Компонент II

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
<b>Деятельность 2.1:</b> <b>Типология заинтересованных сторон и пути распространение знаний</b>	Детальная характеристика заинтересованных сторон для каждой из шести выявленных групп заинтересованных сторон для каждой страны (6 групп в общей сложности)	Консультации с национальными партнерами и лидерами компонентов; круглые столы	Коммуникационные команды ИКАРДА и лидеры национального компонента	Схемы организационных структур с ролями, функциями, подходами для каждой группы; конкретные списки заинтересованных сторон для каждой страны	май – июнь 2014 г.	
	Анализ потребностей всех шести заинтересованных сторон относительно коммуникационных материалов	Сбор информации в ходе круглых столов / консультации с экспертами / подготовка вопросников	Коммуникационные команды ИКАРДА и лидеры национального компонента	Списки коммуникационного материала / мероприятия / потребности в тренингах; Шаблоны коммуникационных материалов	May – June 2014	
	Анализ воздействия	План основных этапов Учет числа фермеров / лиц, принимающих решения / подготовленных отчетов / агентств по развитию  Установить минимальное количество людей для каждой группы заинтересованных сторон (например, 200 фермеров, 20 лиц, принимающих решения)	Коммуникационные команды ИКАРДА и лидеры национального компонента	Доклады об оценке воздействия / матрицы	В процессе	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
<b>Деятельность 2.2: Обмен знаниями относительно технических пакетов</b>	Адаптация аналитических данных, в том числе результатов социально-экономических анализов, рисков, доходности, ограничений	Сбор вводных данных, предоставленных лидерами <b>компонента III</b> ; перевести их на местные языки	Национальные лидеры <b>Компонента II</b> и <b>Компонента III</b> ; сотрудники ИКАРДА	Аналитические данные на всех соответствующих языках	Завершение подготовки докладов руководителями <b>Компонента III</b> и передача их нац. лидерам	
	Организация круглых столов для лиц, принимающих решения, чтобы обсудить технологические пакеты, в том числе организация выставок технологических пакетов УУЗР / доноры и агентства по развитию / Организация визитов для лиц, принимающих решения и СМИ на демонстрационные участки в странах-участницах (на национальном и региональном уровнях)	Отправить разработку политических рекомендаций лицам, принимающим решения для эффективного диалога круглых столов с участием лидеров <b>Компонента III</b> ; пригласить журналистов	Национальные лидеры <b>Компонента II</b> и <b>Компонента III</b> и сотрудники ИКАРДА принимают участие в круглых столах; Лидеры <b>Компонента I</b> и <b>Компонента II</b> участвуют в организации визитов на демонстрационные участки	Рекомендации, полученные от заинтересованных сторон / план работы с лицами, принимающими решения / журналистские отчеты	При условии наличия аналитических данных <b>Компонента III</b> ; и идентификация дем. участков <b>Компонента I</b>	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
	<p>Подготовка коммуникационного материала для фермеров:</p> <p>Небольшие книги с рекомендациями;</p> <p>Брошюры</p> <p>Небольшие карманные календари (с информацией о технологиях)</p>	Сбор информации из <b>Компонента I</b> ; печатные материалы	Лидеры <b>Компонента I</b> и Компонента II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Четыре технологии для каждой страны:</li> <li>• Небольшие рекомендационные книги - не менее 200 по каждой технологии</li> <li>• Брошюры - не менее 200 по каждой технологии</li> <li>• Маленькие карманные календари (с информацией о технологиях; 3-х летний календарь) - не менее 200 по каждой технологии</li> </ul>	Зависит от вводных данных <b>Компонента I</b> ; конец 2014 года	
	Подготовка инфо-графика для всех шести групп заинтересованных сторон	Подготовка инфо-графику для четырех технологических пакетов после сбора вводных данных <b>Компонента I</b> ; из литературы и WOCAT и других источников	<b>Компонент I</b> для вводных данных и Компонент II для подготовки постеров инфо-графика	Постеры инфографика для четырех технологических пакетов - 100 постеров в общей сложности	Зависит от вводных данных <b>Компонента II</b> ; конец 2014 года	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
	Создание видеофильмов	Создание документального фильма о технологических пакетах (4 видео фильма для каждой технологии в каждой стране - 3-5 минут на местных языках с субтитрами на русском и английском языках); сбор соответствующего видео из источников, таких как WOCAT и др.	Лидеры <b>Компонента I</b> и Компонента II; коммуникационная команда ИКАРДА	Четыре видеофильма для каждой технологии в каждой стране - 3-5 минут на местных языках с субтитрами на русском и английском языках; плюс фильмы из других источников; списки фильмов	Зависит от вводных данных <b>Компонента I</b> ; конец 2014 года	
	Организация полевых дней для фермеров и служб по распространению знаний (для технологических пакетов УУЗР) на демо-участках, желательно пригласить инструкторов из числа ведущих фермеров из других стран	Приглашение ведущих фермеров или крестьян (вблизи демо – участков)	<b>Компонент I</b> и Компонент II;	1 полевой день для каждой агроэкосистемы в каждой стране	август - сентябрь 2014 г.	
	<b>Организация единого архива для проектов центров КГ и других проектов развития в рамках ИСЦАУЗР</b>	Сбор информации, связанной с основными проектами по землеустройству в каждой стране	Национальные лидеры Компонента II	Подробная информация о проектах	Конец отчетного года	
	Вклад в веб-сайт проекта	Обеспечить все отчеты, аналитические данные и т.д. веб-менеджеру проекта, по мере их готовности	Компонент II	Различные отчеты / результаты коммуникационных мероприятий	В процессе	



<b>Деятельность</b>	<b>Под-деятельность</b>	<b>Методы</b>	<b>Команда</b>	<b>Результаты</b>	<b>Сроки</b>	<b>Бюджет (\$)</b>
	Перевести информацию о выбранных технологических пакетах на местные языки	Выберите некоторые технологические пакеты для перевода на местные языки для применения фермерами	Национальные лидеры Компонента II	Перевод материалов	Конец отчетного года	
	Создание центрального архива всех технологий / результатов коммуникационных мероприятий (при необходимости может быть создана база данных (при наличии финансирования))	Сбор информации / вводные данные, по мере готовности	Национальные лидеры Компонента II	Центральный архив всех технологий / результатов коммуникационных мероприятий	В процессе	
<b>Деятельность 2.3: Наращивание потенциала и устойчивый доступ к знаниям</b>	Подготовка инструкторов для обучения фермеров	Специалисты из научно-исследовательских институтов, учебных заведений приглашены для обучения инструкторов. Организация опроса по учебным модулям для получения обратной связи/оценки	Национальные лидеры Компонента II	План обучения, определенное количество подготовленных инструкторов, обученных фермеров	В процессе	
	Подготовка учебных модулей для инструкторов	Технологические данные по технологиям / информация о методах обучения	Национальные лидеры Компонента II	Учебные материалы для обучения фермеров	В процессе	
	Учебные модули для инструкторов, в том числе другая необходимая информация университетов	Связаться с соответствующими преподавателями из университетов для обеспечения	Национальные лидеры Компонента II	Учебные материалы для обучения фермеров	В процессе	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
		необходимым материалом				

## **Мероприятия для отдельных заинтересованных сторон (6 групп заинтересованных сторон)**

### **Группа 1 (Лица, принимающие решения, государственные учреждения, министерства и т.д.)**

- Подготовка аналитических записок, в том числе социально-экономического анализа предлагаемых технологических пакетов
- Организация круглых столов для обсуждения технологических пакетов
- Организация посещений для лиц, принимающих решения, на демонстрационные участки в странах-участницах (на национальном и региональном уровнях)

### **Группа 2 (научно-исследовательские институты и организации, учебные заведения и т.д.)**

- Анализ потребностей фермеров и других землепользователей
- Подготовка инструкторов для специалистов группы 3 + заинтересованных сторон группы 4, которые будут обучать фермеров
- Как институционализировать знания с помощью технологий в рамках курсов / модулей

### **Группа 3 + Группа 4 (информационные центры, консультативные и тренинговые услуги (консультационное обучение и инновационный центр в Кыргызстане), консультативные центры, фермерские советы + другие службы распространения знаний, КРАСС в Узбекистане, РАН в Кыргызстане, в том числе средств а массовой информации)**

- Подготовка информации / распространение материалов на языке фермеров
- Подготовка брошюр / бюллетеней / инфо-графиков
- Подготовка инструкторов для специалистов, которые будут обучать фермеров
- Учебные модули для подготовки отдельных фермеров
- Медиа туры на демонстрационные участки

### **Группа 5 (фермеры и другие землепользователи)**

- Брошюры, флаеры
- Видеофильмы
- Визиты на демонстрационные участки
- Полевые дни
- Выставки
- Туры для ведущих фермеров для обмена опытом и знаниями

### **Группа 6 (доноры, агентства по развитию)**

- Организация координационных совещаний для организации деятельности проекта, обмена информацией о текущих проектах
- Отчеты, содержащие данные / информацию об участках проекта / демонстрационных участках / технологиях
- Организация единой базы данных для проектов центров КГ и других проектов развития в рамках ИСЦАУЗР

Детальный рабочий план на второй год (апрель 2014 г. -апрель 2015 г.) - Компонент III

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
Деятельность 3.1: Укрепление знаний, основанных на фактических данных	Провести исследование для того, чтобы (I) определить существующие государственные службы по распространению знаний, частные консультационные услуги и организаций гражданского общества; (II) определить возможности, которые помогут в распространении технологий УУЗР и (III) использовать выводы, сделанные в рамках данного изучения в целях обоснования политики относительно подходов и необходимых благоприятных условий для улучшения широкого внедрения пакетов УУЗР	Ускоренный обзор институтов, участвующих в сельскохозяйственных консультационных услугах в каждой стране (сфера деятельности, область обслуживания, пропаганда ...)  Организация рабочих встреч для подтверждения выводов исследований, и поиска путей решения проблем, связанных с консультативными услугами с помощью политического диалога и / или целевого коммуникационного материала	Подлежит уточнению	Данные опросов собраны и сведены в таблицу  Итоговый отчет о результатах исследования услуг по распространению знаний  Рабочие встречи в каждой стране (макс. 5 в общей сложности) для проверки результатов и оценки вариантов укрепления сельскохозяйственных консультационных услуг	Июнь 2014 г.  Декабрь 2014 г.  Февраль - Март 2015 г.	
	Выявление политических барьеров, в частности тех, которые связаны с землепользованием и потенциально ограничивают широкое распространение и принятие пакетов УУЗР	Обзор и анализ существующих политик управления земельными ресурсами (CCBY /SWOT-анализ)  Обобщение опыта каждой из 5 относительно (I) конкретных проблем, которые были решены и извлеченных уроков, (II) направление политики относительно потенциала масштабного распространения пакетов УУЗР	Подлежит уточнению	Информационный доклад о проекте по вопросам политики и извлеченных уроков, с целью информирования политического диалога  Политические связи (информационный доклад, диалог) с содержанием конкретных знаний относительно вопросов землепользования и возможностей, выявленных для улучшения распространения пакетов УУЗР	Апрель 2015 г.  Июль 2015 г.	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
	<p>Провести экономическую и финансовую оценку практик УУЗР</p> <p>Провести тренинг курс для национальных партнеров по оценке технологий УУЗР, уделяя особое внимание гендерным вопросам)</p>	<p>Анализ затрат и выгод практик УУЗР</p> <p>Семинар по улучшению понимания гендерных аспектов в области сельского хозяйства и методам оценки результатов в гендерных вопросах в рамках внедряемого пакета УУЗР</p> <p>Моделирование экономических последствий УУЗР в снижении уязвимость к изменению климата (ИК)</p>	Подлежит уточнению	<p>Семинар для определения концептуальных методологий / структур для проведения анализа затрат и выгод (СВА) пакетов УУЗР (20 человек плюс ИКАРДА)</p> <p>Семинар по улучшению понимания гендерных аспектов в сельском хозяйстве и оценке результатов в гендерных вопросах в рамках внедряемого пакета УУЗР (около 30 человек из ЦА и ИКАРДА) в сотрудничестве с <b>Компонентом 1</b> при наличии финансирования (подлежит обсуждению)</p> <p>Первый предварительный документ по основам концептуальной методологии для обсуждения (<b>в сотрудничестве с компонентом 1</b>)</p> <p>Завершение документа по концептуальной основе методологий</p> <p>Рабочие документы и политические связи (информационные доклады, диалоги) на основе данных, собранных на демонстрационных участках и в рамках смежной научно-исследовательской деятельности, направленной на определение полезных неэкономических последствий внедрения пакета УУЗР (<b>в сотрудничестве с компонентом 1</b>)</p>	<p>Июнь 2014 г. (Семинар в Душанбе)</p> <p>подлежит уточнению</p> <p>Сентябрь 2014 г. (возможность внешнего финансирования)</p> <p>Сентябрь 2014 г.</p> <p>Декабрь 2014 г.</p> <p>Декабрь 2016 г.</p>	
	<p>Достижение понимания текущего процесса регистрации земельных участков в каждой стране</p>	<p>Обзор эволюции прав собственности на землю и их последствия для землепользования и внедрения практик УУЗР.</p> <p>Извлечь уроки стран-партнеров с успешными программами земельной реформы (например,</p>	Подлежит уточнению	<p>Окончательный предварительный обзор литературы по землеустройству (проблемы и возможности для распространения пакетов УУЗР)</p> <p>Политические рекомендации по землевладению</p>	<p>Сентябрь 2014 г.</p> <p>Декабрь 2015 г.</p>	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
		регистрации земли в Кыргызской Республике)				
Деятельность 3.2: Политический диалог для ускорения внедрения УУЗР	<p>Идентификация политических чемпионов (влиятельные лица/структуры), которые в состоянии рекомендовать пути (и инструменты) для эффективного информирования и оказания влияния на государственную и многостороннюю институциональную политику в целях улучшения внедрения пакетов УУЗР</p> <p>Разработка материала по коммуникационной политике (2014-2015 гг.) Организация семинаров для политического диалога Проведение семинаров по разработке политики на основе фактических данных и рекомендаций по вопросам политики (2015 г.)</p>	Провести анализ и создать форумы для содействия диалогу	Подлежит уточнению	<p>Влиятельные лица / чемпионы, определенные для каждой страны</p> <p>Материал по коммуникационной политике подготовлен и распространен: – Краткая сводка по политике – Отчеты по семинарам по разработке политики – Укрепление функций координации и коммуникации бенефициаров (<b>в сотрудничестве с компонентом 2</b>)</p> <p>Данные для отображения /картирования учреждений и организаций, определенных в качестве потенциальных партнеров для внедрения и распространения, собраны для реализации в рамках <b>Компонента 2</b> (требует идентификации и сотрудничества с учреждениями, выбранными для проведения мероприятий по картированию)</p> <p>Семинар по инновационной платформе, направленный на улучшение внедрения пакетов УУЗР (определены контекстные обозначения и проспекты для каждой страны) Поиск финансирования из другого источника</p>	<p>До июня 2014 г.</p> <p>Июнь 2014 г. – январь 2016 г.</p> <p>Ноябрь 2014 г.</p> <p>4 - й квартал 2014 г.</p> <p>Март 2015 г.</p> <p>Декабрь 2013 г. (Деятельность уточнена и дата перенесена на апрель 2015 г.)</p>	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
				<p>Документ с изложением позиции относительно контекстуально - соответствующих проспектов для создания инновационной платформы и улучшения внедрения пакетов УУРЗР</p> <p>Рекомендации в области политики (в том числе определение показателей готовности внедрения и распространения и проблем, которые будут рассматриваться)</p>		

Подробный рабочий план для второго года (Апрель 2014 г. – апрель 2015 г.) – Компонент 4 для региональной деятельности

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
<b>Деятельность 4.1:</b> <b>Тренинги, демонстрационные участки, моделирование для поддержки технических результатов</b>	Наращивание потенциала в области детализации моделей ИК	Тренинг по GCM детализации результатов		Калибровка детализированной модели и обучение национальных сотрудников	1 июля 2014 г.	
	Биофизическая оценка и оценка на основе моделирования воздействия изменчивости и изменения климата	Разработка метода оценки воздействия ИК		Оценка воздействия ИК и оценка выбранных практик УУЗР	31 декабря 2014 г.	
	Создание дополнительных демонстрационных участков в рамках связи с ИПК-ЗС	Создание полевых участков для демонстрации перспективных технологий УУЗР на пилотных участках ИПК-ЗС		Демонстрационные поля готовы и доступны для фермеров и участников проекта	На протяжении проекта	
	Создание карт схожести на региональном уровне и обучение	На основе разработанных критериев для выбранных практик УУЗР		Региональная карта соответствия практик УУЗР	Январь 2015 г.	
<b>Деятельность 4.2:</b> <b>Аналитическая работа и распространение результатов для поддержки процесса компоновки и диалога с заинтересованными сторонами</b>	Подготовка учебных материалов, инфо- графиков	Дизайн инфо- графиков, перевести на простой язык отчетов		Материалы тренингов, включая презентации, руководства, постеры	На протяжении проекта	
	Подготовка аналитических записок	Анализ имеющейся информации об УУЗР и поиск литературы		Стратегические отчеты	На протяжении проекта	
	Подготовка материалов СМИ для распространения и проведения региональных ярмарок	Брошюры, видео, плакаты, ярмарки		Брошюры, видео, плакаты, ярмарки	На протяжении проекта	
	Веб-сайт проекта и база данных УУЗР	Веб-дизайн, сбор практик УУЗР, форматирование, единое описание		Вебсайт и база данных	Июнь 2015 г. и На протяжении проекта	



Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Сроки	Бюджет (\$)
<b>Деятельность 4.3: Координация</b>	Планирование и проведение региональных мероприятий, включая вводное совещание, совещание по планированию, годовое совещание, тренинги, СРК	Координация с компонентами проекта, страновыми группами, партнерами		Организованные мероприятия	На протяжении проекта	
